

Project Breedband Land van Cuijk



Raadsconferentie 22 februari 2017



Project Breedband Land van Cuijk

1. Resultaten vraagbundeling
2. Scenario's
3. Overleg marktpartijen
4. Uitvoeringsaspecten
 - contract marktpartij
 - toekomstige rol van LVCNET
 - geldlening / vraagbundelingskosten
 - leges- en degeneratiekosten
 - toezicht en projectmanagement
 - POP-stations
5. Planning



SUPERSNEL INTERNET
IN HET LAND VAN CUIJK


hier > nu > glasvezel

Project Breedband Land van Cuijk



Resultaat vraagbundeling

- Vraagbundeling afgerond in juli 2016;
- Beoogde resultaat van 43% niet gehaald;
- Eindstand op 32%.

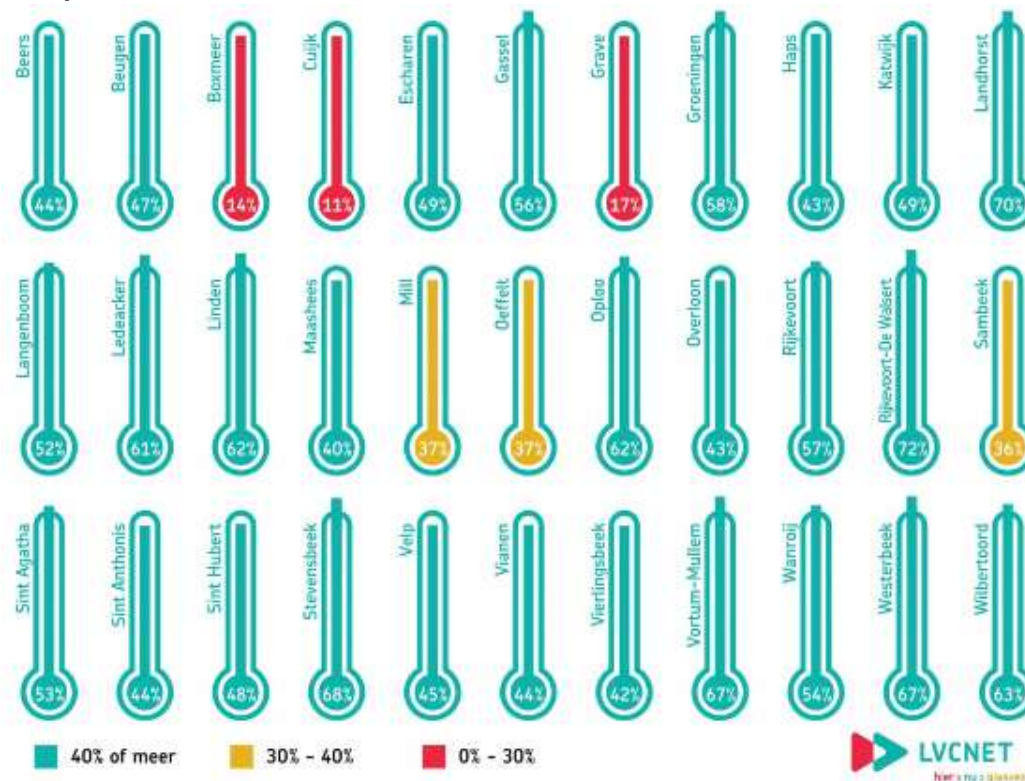

Project Breedband Land van Cuijk



Scenario's

Opdracht gemeenteraden (Plan van Aanpak):

- Scenario 1: 100% verglazen Land van Cuijk:
 - Dit scenario is niet zonder meer haalbaar
- Scenario 2: haalbaarheid per gemeente:
- Markttuitvraag

Vervolg

- Benoemen parameters voor doorrekening van de scenario's;
- Inventarisatie voorwaarden voor lening bij bank;

Uitwerken scenario's "on-hold" door markttuitvraag.



Project Breedband Land van Cuijk



Markttuitvraag

- Vijf marktpartijen uitgenodigd door LVCNET en gemeenten Land van Cuijk;
- Portfolio opgesteld met randvoorwaarden:
 - 100% verglazing Land van Cuijk;
 - Vergoeding kosten vraagbundeling;
 - Clubkasactie;
 - Eigen bijdrage buitengebied;
 - Abonnementsprijzen;
 - Open netwerk;
 - Planning: bij voorkeur oplevering netwerk eind 2018.



Project Breedband Land van Cuijk



Gesprekken marktpartij

- Marktpartij is bereid om alle adressen in Land van Cuijk aan te sluiten (100% verglazing);
- Op dit moment zijn gesprekken gaande om te komen tot overeenstemming over onder andere:
 - Leges- en degeneratiekosten;
 - Locaties POP stations (trafo's);
 - Toezicht bij de uitvoering;
 - Planning.





Overige gesprekken

- Gemeente met LVCnet – afwerken overeenkomst
- LVCnet met marktpartij – overnemen afspraken coöperatie, rol in de aanlegfase, verzorgen van opswing
- LVCnet met providers – afwickelen clubkasactie
- Providers met marktpartij – prijs- en marketingafspraken, technische invulling



Project Breedband Land van Cuijk



Vergoeding kosten: Leges- en degeneratiekosten

- Op basis van legesverordening 2017 wordt een projectafspraken gemaakt;
- Onderhandeling over degeneratiekosten en uitvoeringsvoorwaarden.



Project Breedband Land van Cuijk



Locaties POP stations

- POP staat voor: Points of Presence;
- Trafo-huisjes;
- 2 city POP's (9x3 m.) in Boxmeer en Cuijk;
- 14 area POP's (5x3 m.) verdeeld over de vijf gemeenten;
- Uiterlijke verschijningsvorm is bespreekbaar, evenals inpassing in groen;
- Onderzoek naar geschikte locaties is gestart.





Coördinatie en toezicht bij uitvoering

- Samenwerking gemeenten Land van Cuijk: één uitvoeringsorganisatie;
- Toezicht vanuit de gemeenten op aanleg en herstraten;
- Marktpartij is voornemens opdracht te verstrekken aan 2 aannemers;
- Aanleg met 8 graafploegen per aannemer.




Project Breedband Land van Cuijk



Voorlopige planning

- Sluiten overeenkomst 2^e kwartaal 2017;
- Voorbereiding marktpartij t/m juli 2017;
- Start aanleg netwerk augustus 2017;
- Aanlegperiode circa 1,5 jaar.



Project Breedband Land van Cuijk
